

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

«__» _____ 2025 г.

**БАЗОВЫЙ ПЛАН ПО СТОИМОСТИ ПРОЕКТА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

«__» _____ 2025 г.

Оглавление

1 Введение3

5

6

8

9

12

13

15

1 Введение

Настоящий документ определяет Базовый план по стоимости (Cost Baseline) для проекта «Книжный магазин», представляющий собой утвержденный распределенный во времени бюджет. Базовый план служит контрольным показателем для измерения и мониторинга эффективности выполнения работ по проекту в разрезе затрат. План разработан в соответствии с требованиями Плана управления стоимостью проекта и является компонентом Плана управления проектом.

Целью разработки настоящего базового плана является создание интегрированного временного графика финансирования проекта, который обеспечит:

- Сравнение плановых и фактических показателей стоимости
- Своевременное выявление отклонений от утвержденного бюджета
- Обоснование управленческих решений в области контроля стоимости
- Гарантии завершения проекта в рамках утвержденного бюджета

Для достижения этих целей документ устанавливает следующее:

- Определение структуры распределения затрат по фазам и контрольным точкам проекта
- Установление плановых значений стоимости для каждой вехи проекта
- Формирование основы для расчета показателей освоенного объема (EVM)
- Создание механизма контроля использования резервов на непредвиденные расходы
- Обеспечение прозрачности бюджетного планирования для всех стейкхолдеров проекта

Базовый план разработан в соответствии с требованиями Плана управления стоимостью проекта и является неотъемлемым компонентом Плана управления проектом. План основан на детальных оценках стоимости, выполненных с применением методов «снизу-вверх», параметрического оценивания и экспертных оценок.

Все изменения базового плана должны проходить формальный процесс управления изменениями и утверждаться Управляющим комитетом проекта.

2 Состав базового плана по стоимости

Базовый план по стоимости представляет собой консолидированный документ, содержащий одобренную версию распределенного по периодам времени бюджета проекта. В соответствии с требованиями, базовый план формируется как сумма утвержденных бюджетов для различных операций расписания проекта и включает следующие компоненты.

Включаемые компоненты:

- Бюджеты контрольных счетов
 - Стоимость операций, агрегированная на уровне контрольных счетов ИСР
 - Прямые затраты на выполнение работы по проекту
 - Косвенные затраты, относящиеся к проектной деятельности
- Резервы на непредвиденные расходы
 - Средства для покрытия идентифицированных рисков
 - Рассчитаны методом количественного анализа рисков
 - Распределены по контрольным счетам пропорционально уровню риска
- Распределение по периодам времени
 - Помесячное распределение плановой стоимости (Planned Value - PV)
 - Привязка финансирования к вехам и контрольным точкам проекта
 - Кумулятивное представление в форме S-кривой

Исключаемые компоненты:

- Управленческий резерв
 - Составляет 5% от общего бюджета проекта
 - Не включается в базовый план по стоимости
 - Учитывается отдельно в общем бюджете проекта
 - Требуется отдельного утверждения для использования

Формирование базового плана по стоимости осуществляется на основе строгих методологических принципов, обеспечивающих целостность, точность и согласованность бюджетных показателей.

Иерархия агрегирования стоимости:

1. Оценки стоимости операций => Пакеты работ

2. Пакеты работ + резервы => Контрольные счета
3. Контрольные счета => Базовый план по стоимости

Формирование базового плана по стоимости осуществляется в строгой взаимосвязи с утвержденным календарным планом проекта. Каждая контрольная точка и веха проекта имеют четкое бюджетное обеспечение. Распределение стоимости соответствует последовательности работ, что позволяет избежать неравномерного распределения денежных потоков и обеспечить бесперебойное финансирование проектной деятельности в соответствии с фактическим прогрессом работ. Бюджетные средства распределяются таким образом, чтобы минимизировать финансовые издержки и обеспечить максимальную эффективность использования капитала на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Требование к точности:

- Соблюдение степени точности $\pm 10\%$ для итогового бюджета
- Применение правила округления до 1000 рублей
- Соответствие степени прецизионности, установленной в Плане управления стоимостью

3 Структура базового плана по контрольным счетам

Структура базового плана по стоимости построена на основе системы контрольных счетов, интегрированных с иерархической структурой работ (ИСР) проекта. Каждый контрольный счет представляет собой отдельный элемент финансового учета, объединяющий связанные пакеты работ и соответствующие бюджеты. (см. Таблицу 1)

Контрольные счета сгруппированы по функциональным областям проекта:

- Управленческие счета:
 - УПР.01 - Управление проектом
 - АНА.01 - Бизнес-анализ и проектирование
- Технические счета:
 - РА3.01 - Программирование и настройка
 - ТЕС.01 - Тестирование
- Инфраструктурные счета:
 - ЛИЦ.01 - Лицензионное программное обеспечение
 - ОБО.01 - Оборудование и инфраструктура

- Вспомогательные счета:
 - ОБУ.01 Обучение персонала
 - НАК.01 - Накладные расходы

Каждый контрольный счет содержит следующие бюджетные компоненты:

- Базовый бюджет - прямые затраты на выполнение работ
- Резерв на риски - расчетная на покрытие идентифицированных рисков

Распределение резервов на непредвиденные расходы осуществляется по следующим критериям.

Для счетов с высокой неопределенностью (РАЗ.01, ТЕС.01) резерв составляет 10-12% от базового бюджета, так как обоснован сложностью технических задач, а также учитывает опыт предыдущих аналогичных проектов.

Для счетов со средней неопределенностью (ОБО.01, ОБУ.01) резерв составляет 7-9% от базового бюджета; он учитывает риски поставок и зависимость от внешних исполнителей.

Для счетов с низкой неопределенностью (УПР.01, НАК.01) резерв составляет 5-6% от базового бюджета; он основан на стабильных прогнозах выполнения работ.

По каждому контрольному счету установлены показатели эффективности (CPI, SPI), критические отклонения (~10% от плана), периодичность отчетности (еженедельно/ежемесячно), а также ответственные за исполнение бюджета.

Контрольный счет	Базовый бюджет, руб.	Резерв на риски, руб.	Итого по счету, руб.
УПР.01	600 000	42 000	642 000
АНА.01	700 000	50 000	750 000
РАЗ.01	1 700 000	120 000	1 820 000
ТЕС.01	800 000	30 000	830 000
ЛИЦ.01	850 000	42 500	892 500
ОБО.01	400 000	40 000	440 000
ОБУ.01	150 000	15 000	165 000
НАК.01	420 000	35 000	455 000
Итого	4 620 000	374 500	5 994 500

Таблица 1. Структура базового плана по контрольным счетам

4 Распределение по периодам (S-кривая)

Распределение базового плана по стоимости по временным периодам представлено в форме S-кривой, которая отражает кумулятивное накопление плановой стоимости (Planned Value - PV) на протяжении всего жизненного цикла проекта. Данный подход визуализирует динамику освоения бюджета и позволяет проводить сравнительный анализ плановых и фактических показателей.

Характеристики кривой выполнения:

Август 2025:

- Стартовый период с постепенным набором темпов работ
- Финансирование первоочередных задач запуска проекта
- Заккрытие критических зависимостей последующих этапов

Сентябрь-Октябрь 2025:

- Период максимальной интенсивности выполнения работ
- Пиковая нагрузка на бюджет в связи с параллельным выполнением ключевых задач
- Финансирование основных закупок и наиболее ресурсоемких работ

Ноябрь-Декабрь 2025:

- Фаза завершения проекта с постепенным снижением финансирования
- Финансирование заключительных работ и закрывающих мероприятий

- Резервирование средств на непредвиденные расходы завершающей стадии

Период	Плановая стоимость, руб.	Накопленная стоимость, руб.
Август 2025	960 000	960 000
Сентябрь 2025	1 340 000	2 300 000
Октябрь 2025	1 605 000	3 905 000
Ноябрь 2025	1 255 000	5 160 000
Декабрь 2025	460 000	5 620 000
Резерв на риски	374 500	5 994 500

Таблица 2. Распределение по периодам



Рисунок 1. S-кривая проекта

S-кривая обеспечивает мониторинг выполнения проекта за счет сравнения плановых и фактических показателей, расчета отклонений по стоимости и расписанию, анализа тенденций выполнения бюджета.

S-кривая позволяет сделать расчет оценки по завершении (ЕАС) на основе текущих показателей, спрогнозировать дату завершения проекта, проанализировать достаточность оставшегося бюджета.

5 Требования к финансированию

Требования к финансированию проекта формируются на основании базового плана по стоимости и представляют собой график необходимых денежных потоков для обеспечения бесперебойной реализации проекта.

Финансирование проекта осуществляется в соответствии с утвержденным календарным планом и распределением стоимости по периодам.

Структура требований к финансированию:

- Периодические требования:
 - Ежемесячные объемы финансирования в соответствии с графиком выполнения работ
 - Авансовые платежи для обеспечения стартовой фазы проекта
 - Целевое резервирование средств для критических вех проекта
- Общее требование к финансированию:
 - Базовый план по стоимости - 5 994 500 руб.
 - Управленческий резерв - 250 000 руб.

Итого общий бюджет проекта: 6 244 500 руб.

Финансирование проекта характеризуется неравномерным распределением и представлено в виде ступенчатой функции.

Предварительное финансирование:

- Авансовый платеж: 1 000 000 руб.
- Назначение: обеспечение начальных закупок и резервирование ресурсов

Квартальное распределение:

- 3 квартал 2025 (август-сентябрь) 2 100 000 руб.
- 4 квартал 2025 (октябрь-декабрь) - 3 144 500 руб.

Принципами формирования графика являются привязка к вехам проекта и управление денежными потоками.

Привязка к вехам проекта:

- Платежи синхронизированы с достижением ключевых контрольных точек
- Финансирование этапов зависит от результатов приемки работ
- Учет временных лагов между выполнением работ и их оплатой

Управление денежными потоками:

- Оптимизация объема привлекаемых средств
- Минимизация кассовых разрывов

- Снижение стоимости заемного капитала

Источником финансирования проекта являются собственные средства компании.

Период	Финансирование за период, руб.	Кумулятивное финансирование, руб.	Назначение
Аванс	1 000 000	1 000 000	Подготовительные работы, закупки
Август 2025	960 000	1 960 000	Запуск проекта, начальные работы
Сентябрь 2025	1 140 000	3 100 000	Основной объем работы
Октябрь 2025	1 205 000	4 305 000	Пиковая нагрузка
Ноябрь 2025	855 000	5 160 000	Завершающие работы
Декабрь 2025	460 000	5 620 000	Финальные мероприятия
Резерв на риски	374 500	5 994 500	Предвиденные ситуации
Управленческий резерв	250 000	6 244 500	Непредвиденные ситуации

Таблица 3. Финансирование проекта

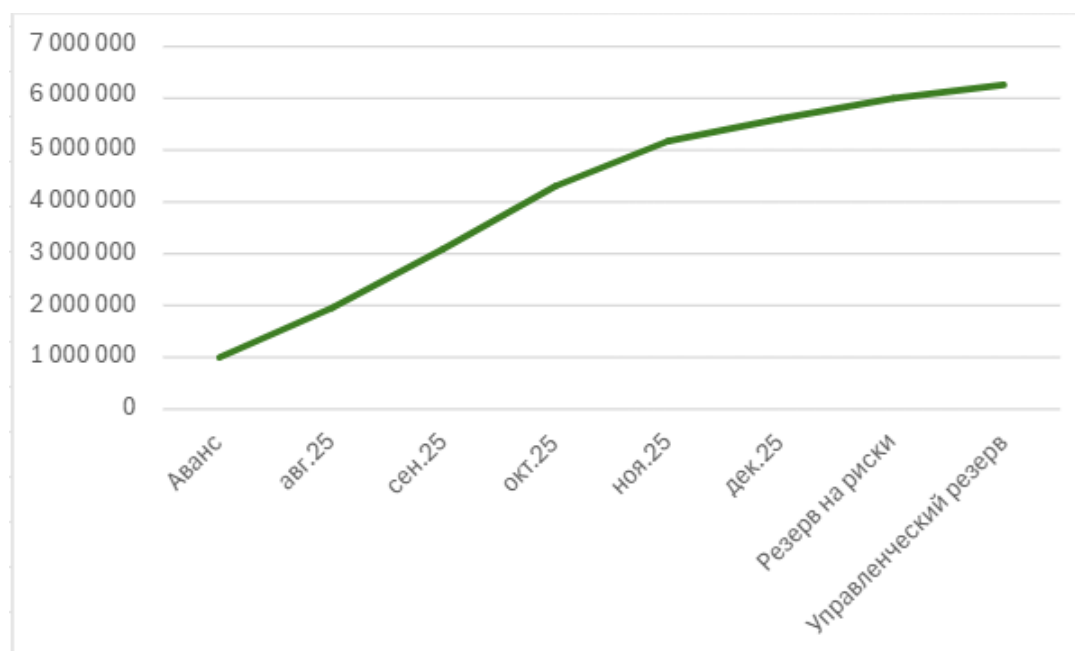


Рисунок 2. График финансирования проекта

6 Процедуры контроля изменений

Процедуры контроля изменений базового плана по стоимости представляют собой формализованный процесс управления всеми корректировками, влияющими на утвержденный бюджет проекта. Данный регламент обеспечивает сохранение целостности базового плана как основного контрольного показателя при одновременной гибкости управления в условиях изменяющихся требований.

Изменения в базовый план по стоимости могут быть инициированы при наличии конкретных оснований:

- Изменения содержания проекта:
 - Утвержденные запросы на изменение
 - Корректировка требований заинтересованных сторон
 - Результаты уточняющего планирования на поздних этапах проекта
- Изменения внешней среды:
 - Колебания рыночных цен на материалы и оборудование
 - Изменения валютных курсов для импортных закупок
 - Корректировка налогового и законодательного регулирования
- Реализация проектных рисков:
 - Наступление идентифицированных рисков, требующих использования резерва
 - Изменение вероятностей или воздействий существующих рисков

Процедура внесения изменений включает в себя подачу запроса на изменение с формированием описания предполагаемых изменений, обоснования необходимости корректировки, предварительную оценку воздействия на стоимость и расписание; оценку воздействия изменений с анализом влияния на все компоненты тройственного ограничения, оценкой последствий для заинтересованных сторон, проверкой соответствия целям проекта и бизнес-обоснованию; утверждение изменений с рассмотрением Управляющим комитетом проекта, принятием решения об утверждении/отклонении изменений, определением приоритетности при наличии конфликтующих изменений; внедрение и документирование с обновлением базового плана по стоимости,

регистрацией изменений в реестре изменений, уведомлением всех заинтересованных сторон.

В зависимости от степени воздействия на бюджет изменения утверждаются на различных уровнях:

- Изменения в пределах полномочий Менеджера проекта (до 5% от стоимости контрольного счета):
 - Перераспределение средств между статьями затрат в рамках контрольного счета
 - Корректировка сроков финансирования без изменения общей стоимости
- Изменения, требующие утверждения Управляющим комитетом (свыше 5% от стоимости контрольного счета):
 - Использование резерва на непредвиденные расходы
 - Изменение базовых бюджетов контрольных счетов
 - Перераспределение средств между контрольными счетами
- Изменения, требующие утверждения Спонсором проекта (свыше 10% от общего бюджета):
 - Использование управленческого резерва
 - Корректировка общего бюджета проекта
 - Изменение ключевых вех и целевых показателей

Все изменения подлежат обязательному документированию в реестре изменений, версионности базового плана, отчетности по изменениям.

7 Связь с другими документами проекта

Базовый план по стоимости является интеграционным документом, находящимся в тесной взаимосвязи с другими компонентами системы управления проектом. Эффективное управление стоимостью возможно только при обеспечении согласованности и непротиворечивости всех связанных документов.

С расписанием проекта:

- Прямая зависимость распределения стоимости от временных параметров работ
- Синхронизация вех и контрольных точек с графиком финансирования

- Учет длительности и последовательности работ при формировании S-кривой
- Совместный анализ отклонений по срокам и стоимости
- Актуализация сроков выполнения зависимых работ при изменении бюджета.

С реестром рисков:

- Использование результатов качественного и количественного анализа рисков для расчета резервов
- Отражение реализованных рисков в виде изменений базового плана
- Корректировка резервов на непредвиденные расходы при обновлении реестра рисков
- Учет эффективности мер реагирования на риски при контроле стоимости
- Корректировка статуса реализованных рисков и остатков резервов.

С планом управления стоимостью:

- Реализация методологий и процедур, установленных в плане управления стоимостью
- Соблюдение установленных степеней точности и прецизионности
- Применение утвержденных методов измерения освоенного объема
- Выполнение требований к отчетности и мониторингу

Оценки стоимости операций:

- Уточнение стоимостных показателей на уровне рабочих пакетов
- Актуализация параметров для параметрического оценивания
- Корректировка нормативов и стандартов стоимости

8 Заключение

Настоящий Базовый план по стоимости является официально утвержденным документом, устанавливающим целевые показатели бюджета проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3» и служащим эталоном для контроля стоимости на протяжении всего жизненного цикла проекта.

Базовый план отражает консолидированную оценку стоимости работ проекта в размере 5 994 500 рублей, распределенную по контрольным счетам и временным периодам, с учетом резерва на предвиденные расходы в объеме 374 500 рублей. Управленческий резерв в размере 250 000 рублей утвержден отдельно и не входит в базовый план.

Базовый план по стоимости подлежит регулярному мониторингу посредством метода освоенного объема (EVM) и может быть скорректирован только через формальный процесс управления изменениями с утверждения Управляющего комитета проекта.

Соблюдение положений настоящего документа гарантирует достижение целей проекта в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета.
