

Общество с ограниченной ответственностью Книжный магазин «Букка»

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Букка»

_____/Назаров А.А./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Спонсор проекта

_____/Макаров Г.Д./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ ПРОЕКТА

**«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ "КНИЖНЫЙ МАГАЗИН"
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_____/Кочеткова М.П./

МП

« ____ » _____ 2025 г.

Оглавление

3

4

8

9

10

11

13

15

18

20

21

25

1 Введение

Настоящий План управления коммуникациями разработан для проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С:Предприятие 8.3» и является неотъемлемым компонентом Плана управления проектом. Основная цель документа - создание единой системы коммуникационных процессов, обеспечивающей эффективный и своевременный обмен информацией между всеми заинтересованными сторонами проекта.

Ключевые задачи плана:

- Определение потребностей стейкхолдеров в информации
- Установление стандартов и процедур коммуникации
- Создание эффективной системы отчетности
- Обеспечение прозрачности проектной деятельности
- Минимизация коммуникационных рисков
- Оптимизация времени, затрачиваемого на коммуникации

Документ распространяется на всех участников проекта без исключений: команда проекта, управляющий комитет, ключевые показатели, внешние исполнители, функциональные руководители задействованных подразделений.

Документ является динамическим инструментом управления и может быть скорректирован в установленном порядке по мере развития проекта и изменения потребностей стейкхолдеров.

2 Требования заинтересованных сторон к коммуникациям

Требования к коммуникациям были выявлены в процессе анализа заинтересованных сторон проекта через серию интервью, анкетирование и рабочие встречи. Для каждой группы стейкхолдеров определены оптимальные каналы, частота и формат коммуникаций, обеспечивающие эффективное взаимодействие и удовлетворение информационных потребностей.

Управляющий комитет проекта

Состав:

- Спонсор проекта: Макаров Г.Д.
- Генеральный директор: Назаров А.А.

Информационные потребности:

- Стратегические решения и ключевые показатели проекта
- Финансовая отчетность и использование бюджета
- Критические риски и проблемы, требующие эскалации
- Достижение ключевых вех и контрольных точек
- Изменения, влияющие на бизнес-цели проекта

Требования к коммуникациям:

- Периодичность: Ежемесячные отчетные совещания
- Формат: Презентации с акцентом на визуализацию данных
- Уровень детализации: Высокоуровневый, с концентрацией на бизнес-показателях
- Каналы: Личные встречи, официальные email-отчеты
- Язык: Деловой русский, с минимальным использованием технической терминологии

Критические требования:

- Максимальное время реакции на эскалированные вопросы - 24 часа
- Обязательное предоставление вариантов решений для рассматриваемых проблем
- Финансовая информация должна быть представлена в сравнении с плановыми показателями

Руководитель проекта

Состав:

- Ответственный: Кочеткова М.П.

Информационные потребности:

- Детальная информация о статусе всех задач проекта
- Проблемы и риски на операционном уровне
- Ресурсная загрузка и производительность команды
- Качество выполняемых работ и соответствие стандартам
- Обратная связь от всех групп стейкхолдеров

Требования к коммуникациям:

- Периодичность: Ежедневное взаимодействие с командой
- Формат: Разнообразный - от кратких устных обсуждений до детальных письменных отчетов
- Уровень детализации: Детальный, с возможностью drilling down до уровня конкретных задач
- Каналы: Непосредственное общение, мгновенные сообщения, email, системы управления проектами
- Язык: Профессиональный, с использованием как бизнес-так и технической терминологии

Критические требования:

- Ежедневное обновление информации о статусе критических задач
- Немедленное уведомление о проблемах, угрожающих срыву сроков
- Регулярная формализованная обратная связь от команды проекта

Команда проекта (внутренние участники)

Состав:

- Ключевые пользователи от торгового отдела, склада, бухгалтерии
- Сотрудники ИТ-отдела

Информационные потребности:

- Четкие и однозначные требования и задачи
- Технические спецификации и стандарты выполнения работ
- Расписание работ и сроки выполнения задач
- Информация о изменениях в требованиях и подходах

- Обратная связь по результатам работы

Требования к коммуникациям:

- Периодичность: Ежедневные оперативные взаимодействия
- Формат: Четкие письменные задания, протоколы совещаний
- Уровень детализации: Детальный, с конкретными инструкциями
- Каналы: Системы управления задачами, email, регулярные совещания
- Язык: Профессиональный, с учетом специализации участников

Критические требования:

- Минимизация непродуктивных совещаний
- Четкие и измеримые критерии приемки работ
- Своевременное предоставление необходимой информации для выполнения задач

Внешние исполнители

Состав:

- Бизнес-аналитик (консалтинговая компания)
- Программист 1С (сертифицированный партнер)
- Тестировщик (ИТ-компания)
- Тренер (учебный центр 1С)

Информационные потребности:

- Технические задания и спецификации требований
- Графики работ и сроки поставки результатов
- Информация о изменениях в требованиях
- Обратная связь по предоставляемым результатам
- Информация о процедурах приемки работ

Требования к коммуникациям:

- Периодичность: Согласно графикам, определенным в договорах
- Формат: Формализованные документы, официальная переписка
- Уровень детализации: Детальный, с технической спецификой
- Каналы: Email, системы документооборота, специализированные платформы

- Язык: Профессиональный, с использованием технической терминологии

Критические требования:

- Своевременное предоставление исходных данных для работы
- Четкие процедуры согласования и приемки работ
- Формализованная система управления изменениями требований

В рамках проекта устанавливаются строгие требования к защите конфиденциальной информации, основанные на категоризации данных по уровням доступа. К информации ограниченного распространения относится:

- Финансовые данные проекта - доступ только для Управляющего комитета и руководителя проекта
- Персональные данные сотрудников - в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
- Коммерческая тайна компании - защита в соответствии с корпоративными политиками

Для каждой категории информации определены санкционированные каналы передачи, методы шифрования и правила хранения, при этом ведется обязательный журнал доступа ко всем чувствительным данным.

Обеспечение непрерывности коммуникационных процессов является критическим требованием для успешной реализации проекта.

- Критическая информация должна быть доступна 24/7 через защищенные каналы
- Резервные каналы коммуникации на случай сбоев основных систем
- Регламентированные сроки ответа на запросы различных категорий

Система уведомлений реализуется через многоуровневые оповещения, включая автоматические email-уведомления, push-уведомления в корпоративном мессенджере и, при необходимости, SMS-информирование для членов Управляющего комитета.

Унификация языка коммуникаций и терминологии является необходимым условием для предотвращения недопонимания между разнородными группами участников проекта.

- Основной язык коммуникаций - русский
- Техническая документация может дублироваться на английском языке при необходимости
- Обеспечение понимания терминологии всеми участниками проекта

Требования к коммуникациям подлежат регулярному пересмотру:

- Ежеквартальный плановый пересмотр
- Внеплановый пересмотр при изменении состава стейкхолдеров
- Корректировка при изменении организационной структуры проекта
- Обновление при изменении технологической инфраструктуры

Актуализация требований осуществляется руководителем проекта с обязательным согласованием с заинтересованными сторонами. Изменения в требованиях формируются в виде дополнений к настоящему плану.

3 Информация для распространения

Стратегическая информация включает информацию, необходимую для принятия управленческих решений на высшем уровне. Эта информация предназначена преимущественно для Управляющего комитета и спонсора проекта, характеризуется высокоуровневым представлением данных с акцентом на визуализацию и аналитику, и распространяется в формате PDF-отчетов и презентаций PowerPoint.

Тактическая информация охватывает данные, необходимые для оперативного управления проектом и координации работ. Основными потребителями тактической информации являются руководитель проекта и руководители функциональных подразделений. Информация представляется в структурированном виде с средним уровнем детализации, преимущественно в формате Excel и Word, а также через дашборды в системе управления проектами.

Операционная информация включает детальные данные, необходимые для непосредственного выполнения работ участниками проектной команды. Данная категория информации предназначена для бизнес-аналитиков, программистов, тестировщиков, тренеров и ключевых пользователей. Форматы представления варьируются от специализированных (XML, JSON для технических спецификаций) до стандартных (Word, PDF, видеоинструкции), с максимально возможным уровнем детализации.

В информацию для внешнего распространения входят сведения, предназначенные для стейкхолдеров, не входящих в непосредственный состав проектной команды, но заинтересованных в ходе проекта. Информация носит общедоступный характер, представляется в адаптированном, не техническом формате, таком как HTML-страницы на корпоративном портале, email-рассылки и буклеты, и строго проверяется на соответствие корпоративным стандартам коммуникаций.

4 Детализация форматов и содержания

Отчет о статусе проекта

- Назначение: Информирование Управляющего комитета и спонсора о текущем состоянии проекта.
- Содержание:
 - Исполнительное резюме: Краткий обзор статуса (по зеленому/желтому/красному принципу), ключевые достижения за период, основные проблемы.
 - Прогресс: Процент завершения по основным вехам, график выполненных работ (S-кривая).
 - Бюджет и затраты: Фактические затраты vs. план (CV, CPI), прогноз по завершении (EAC).
 - Ключевые риски и проблемы: Топ-5 текущих рисков с оценкой вероятности и воздействия, список актуальных проблем.
 - Планы на следующий период: Перечень основных целей и запланированных активностей.
- Формат: Презентация PowerPoint (не более 10 слайдов) и PDF-документ.
- Язык: Русский, деловой стиль, минимум технических терминов.

Техническое задание (ТЗ) и спецификации

- Назначение: Формальное описание требований к системе для разработчиков и тестировщиков.
- Содержание:
 - Детальное описание бизнес-требований и функциональности.
 - Нефункциональные требования (производительность, безопасность).
 - Модели бизнес-процессов "как есть" и "как будет".

- Сценарии использования (Use Cases).
- Интерфейсы интеграции с другими системами.
- Формат: Документ MS Word с использованием единого шаблона, диаграммы в BPMN/UML.
- Язык: Русский, с использованием технической терминологии.

Протокол совещания

- Назначение: Фиксация решений, принятых на совещании, и назначенных действий.
- Содержание:
 - Дата, время, список участников.
 - Повестка дня.
 - Краткое содержание обсуждения по каждому пункту.
 - Принятые решения.
 - Список действий (Action Items): что сделать, кто ответственный, срок выполнения.
- Формат: Документ MS Word (шаблон), размещается в Confluence.
- Язык: Русский, лаконичный и структурированный стиль.

Дашборд в системе управления проектами

- Назначение: Обеспечение прозрачности хода работ для всех членов команды.
- Содержание:
 - Текущий статус задач (To Do, In Progress, Done).
 - Визуализация рабочих процессов (Kanban, Scrum-доски).
 - Графики сгорания задач (Burndown Charts).
 - Распределение задач по исполнителям.
- Формат: Онлайн-дашборд в Jira, доступный по правам.
- Язык: Русский (локализация интерфейса), термины из предметной области.

5 Методы и технологии коммуникации

Синхронные методы коммуникации предполагает одновременное участие сторон в процессе коммуникации и обеспечивает немедленный обмен информацией. К синхронным методам относятся:

- *Личные совещания и рабочие сессии.* Применяются для проведения ежемесячных отчетных совещаний с Управляющим комитетом,

стратегических сессий по планированию этапов проекта и рабочих встреч по решению критических проблем.

- *Виртуальные совещания через платформы видеоконференцсвязи.* Применяются для ежедневных стендапов команды проекта, еженедельных оперативных совещаний и внеплановых обсуждений с внешними исполнителями.
- *Телефонные звонки и голосовая связь.* Применяются для экстренной связи с ключевыми стейкхолдерами, уточнения срочных деталей и оперативного согласования простых решений.

Асинхронные методы коммуникации не требуют одновременного участия сторон и позволяют получать и обрабатывать информацию в удобное время. К асинхронным методам относятся:

- *Электронная почта.* Является основным каналом для официальной переписки, рассылки утвержденных документов, отправки формальных уведомлений и ведения исторической записи коммуникаций.
- *Корпоративный мессенджер.* Применяется для быстрого обмена сообщениями, оперативных уточнений, неформального общения в тематических каналах и чатах.
- *Системы управления проектами (Jira) и совместной работы (Confluence).* Jira используется для формализованного обсуждения задач, заведения дефектов, комментирования и отслеживания истории изменений. Confluence служит единой базой знаний для публикации и комментирования проектной документации, ведения протоколов совещаний и размещения рабочих инструкций.

Методы распространения и публикации информации:

- Корпоративный портал и информационные панели (Dashboards)
- Рассылки уведомлений и оповещений

6 Ресурсы для коммуникаций

Общий бюджет на коммуникационные нужды проекта составляет 175 000 рублей и распределяется по следующим статьям затрат:

Программное обеспечение и лицензии: 50 000 рублей

- Назначение: Приобретение и продление лицензий на корпоративный пакет Microsoft 365 (E3), лицензии Jira Software и Confluence, лицензии Zoom Pro.
- Обоснование: Обеспечение базовой технологической платформы для всех видов коммуникаций.
- Периодичность затрат: Единовременно/ежегодное продление.

Аппаратное обеспечение и инфраструктура: 100 000 рублей

- Назначение: Закупка гарнитур для участников команды, веб-камер для улучшения качества видеосвязи, апгрейд оборудования в основной переговорной комнате (микрофонная система, камера).
- Обоснование: Создание комфортных и технически оснащенных условий для проведения эффективных совещаний, особенно в режиме удаленной работы.
- Периодичность затрат: Единовременно.

Обучение и развитие: 25 000 рублей

- Назначение: Проведение обучающих сессий по эффективному использованию Jira/Confluence для команды проекта и ключевых пользователей; курс по деловым коммуникациям для руководителя проекта.
- Обоснование: Повышение эффективности использования инструментов и культуры коммуникаций в проекте.
- Периодичность затрат: Единовременно.

Ответственный управлением бюджетом является руководитель проекта. Процедура контроля - это ежемесячный мониторинг фактических затрат в сравнении с плановыми показателями. Закладываемый резерв составляет 10% (17 500 рублей) на непредвиденные коммуникационные расходы. Использование резерва согласовывается с Спонсором проекта.

Общие плановые трудозатраты на коммуникационную деятельность составляют 60 человеко-часов в месяц и распределяются следующим образом:

- Руководитель проекта: 40 часов/месяц
 - Назначение: Подготовка и проведение совещаний (УК, оперативные), написание и рассылка статус-отчетов, индивидуальные коммуникации со стейкхолдерами,

разрешение конфликтов, обновление коммуникационного плана.

- Обоснование: Коммуникация является ключевой функцией руководителя проекта.
- Администратор систем / Координатор проекта: 20 часов/месяц
 - Назначение: Техническая поддержка коммуникационных систем (настройка видеоконференций, прав доступа), администрирование Jira/Confluence (создание проектов, настройка рабочих процессов), помощь в подготовке и оформлении коммуникационных материалов, ведение архива коммуникаций.
 - Обоснование: Обеспечение бесперебойной работы инструментов и разгрузка руководителя проекта от технических задач.

7 Процесс эскалации

Процесс эскалации предназначен для систематического и своевременного разрешения вопросов и проблем, которые не могут быть решены на текущем уровне ответственности. Эскалация обеспечивает привлечение руководителей с соответствующими полномочиями для принятия решений, предотвращая блокировку работ и минимизируя негативное влияние на ход проекта.

Уровень 1: Решение в рамках проектной команды

- Участники: Ответственные исполнители, руководитель проекта.
- Временные рамки: До 24 часов с момента идентификации проблемы.
- Компетенция: Решение операционных вопросов, не требующих изменения утвержденных параметров проекта (содержания, сроков, бюджета).
- Незначительные корректировки в расписании не критичных задач.
- Процедура: Обсуждение на ежедневных стендапах, в чатах команды, оперативных совещаниях.

Уровень 2: Эскалация руководителю проекта

- Участники: Руководитель проекта, ответственные исполнители.
- Временные рамки: До 48 часов с момента эскалации.

- Компетенция: Решение тактических вопросов, влияющих на отдельные задачи в рамках утвержденного плана.
- Процедура: Оформление запроса на эскалацию по установленной форме, рассмотрение руководителем проекта на ближайшем оперативном совещании.

Уровень 3: Эскалация в Управляющий комитет проекта

- Участники: Управляющий комитет (Спонсор проекта, Генеральный директор), Руководитель проекта.
- Временные рамки: До 72 часов с момента эскалации.
- Компетенция: Решение стратегических вопросов, требующих изменения утвержденных параметров проекта.
- Процедура: Оформление формального запроса на изменение, рассмотрение на ближайшем заседании Управляющего комитета.

Уровень 4: Эскалация Спонсору проекта

- Участники: Спонсор проекта, Генеральный директор, Руководитель проекта.
- Временные рамки: Немедленно/в течение 24 часов для критических вопросов.
- Компетенция: Решение критических вопросов, оказывающих существенное влияние на успех проекта.
- Процедура: Немедленное уведомление по телефону с последующим оформлением формального запроса.

Любой участник проекта, столкнувшийся с проблемой, которая не может быть решена на его уровне полномочий или угрожает достижению целей проекта, обязан инициировать процедуру эскалации. Первым шагом является четкая фиксация проблемы в установленной форме. Инициатор заполняет раздел, включающий:

- Описание проблемы: Лаконичное и конкретное изложение сути проблемы, без эмоциональной окраски. Указывается, что произошло, когда и в каком контексте.
- Анализ воздействия: Оценка влияния проблемы на ключевые параметры проекта — содержание (какие работы блокируются или требуют пересмотра), сроки (вехи и общая дата завершения), бюджет (дополнительные затраты или использование резервов),

качество (снижение характеристик результата) и риски (потенциальное возникновение новых угроз).

- Предлагаемые варианты решения: Инициатор представляет один или несколько возможных путей решения проблемы с кратким анализом преимуществ и недостатков каждого. Это демонстрирует проактивность и помогает лицам, принимающим решения, в их оценке.
- Рекомендуемый уровень эскалации: На основе анализа воздействия инициатор предлагает, на какой уровень управления следует направить вопрос (Уровень 2, 3 или 4), руководствуясь матрицей полномочий, описанной в разделе 8.2.
- Желаемый срок решения: Указывается желательная дата или период, к которому необходимо принять решение, исходя из критичности проблемы для графика проекта.

После заполнения описанных пунктов инициатор оформляет унифицированную «Форму запроса на эскалацию» (ФЗЭ). Форма является электронным документом в системе Confluence/Jira и содержит следующие обязательные реквизиты:

- Уникальный идентификатор запроса: Присваивается автоматически системой.
- Дата и время инициирования.
- ФИО и роль инициатора.
- Краткое название проблемы.
- Ссылка на связанные задачи или документы в Jira/Confluence.
- Раздел для истории коммуникаций по данному вопросу.

Ответственное лицо, получившее ФЗЭ, обязано в течение 2 рабочих часов подтвердить получение запроса, изменив его статус в системе на «Принят в работу».

8 Обновление плана

План управления коммуникациями является динамичным документом, который требует регулярного пересмотра и актуализации для обеспечения своей релевантности и эффективности на протяжении всего жизненного цикла проекта. Основная цель обновлений — адаптация коммуникационных процессов к изменяющимся условиям проекта, потребностям заинтересованных сторон и извлеченным урокам.

План подлежит обязательному пересмотру в следующих случаях:

- Изменение состава заинтересованных сторон: Появление новых ключевых стейкхолдеров или исключение существующих, изменение их ролей, уровня влияния или информационных потребностей.
- Корректировка содержания проекта (Change Request): Утвержденные изменения в содержании, которые затрагивают границы проекта, ключевые результаты или основные вехи.
- Существенные изменения в расписании или бюджете: Сдвиги в сроках выполнения ключевых этапов, превышение бюджета, требующее пересмотра коммуникационных ресурсов.
- Смена ключевых участников проекта: Назначение нового руководителя проекта, спонсора или замены ключевых исполнителей.
- Изменение организационной структуры или бизнес-процессов компании: Реорганизации, слияния, изменения в корпоративной политике или стратегии.
- Результаты мониторинга эффективности коммуникаций: Систематическое несоответствие коммуникационных процессов установленным KPI, негативная обратная связь от стейкхолдеров.
- Изменение технологической инфраструктуры: Внедрение новых или отказ от старых инструментов коммуникации.
- Форс-мажорные обстоятельства: Возникновение непредвиденных событий, существенно влияющих на коммуникационные процессы.

Установлена следующая обязательная периодичность пересмотра Плана управления коммуникациями:

- Плановый пересмотр: Проводится на ежеквартальной основе в рамках подготовки квартального отчета Управляющему комитету.
- Внеплановый пересмотр: Иницируется по мере необходимости при наступлении событий.

Процесс обновления плана включает следующие этапы:

1. Инициация обновления:

- Любой участник проекта может предложить изменение, направив запрос Руководителю проекта.

- Руководитель проекта анализирует обоснованность запроса и принимает решение о начале процедуры обновления.
2. Анализ воздействия предлагаемых изменений:
 - Руководитель проекта оценивает, как предлагаемые изменения повлияют на текущие коммуникационные процессы, ресурсы, расписание и стейкхолдеров.
 - Проводится при необходимости мини-опрос или интервью с ключевыми стейкхолдерами для сбора обратной связи.
 3. Разработка проекта изменений:
 - Руководитель проекта вносит правки в черновую версию плана.
 - Изменения документируются в виде списка правок с обоснованием каждого изменения.
 4. Согласование проекта изменений:
 - Проект обновленного плана рассылается на согласование ключевым стейкхолдерам, которых затрагивают изменения (например, руководителям подразделений, чьи сотрудники вовлечены в проект).
 - На согласование отводится 5 рабочих дней.
 5. Утверждение обновленного плана:
 - Окончательная версия плана утверждается Руководителем проекта.
 - Изменения, затрагивающие бюджет, сроки или содержание проекта, подлежат дополнительному утверждению Управляющим комитетом.
 6. Публикация и доведение до сведения:
 - Утвержденная версия плана публикуется в центральном репозитории проекта (Confluence).
 - Все участники проекта уведомляются о выходе новой версии и ключевых изменениях через email-рассылку и анонс в общем канале Microsoft Teams.
 - В уведомлении кратко перечисляются основные изменения и их влияние на работу участников.
 7. Архивация предыдущей версии:
 - Предыдущая версия плана сохраняется в архиве проекта для обеспечения прослеживаемости изменений.

Руководитель проекта несет персональную ответственность за инициирование, координацию и выполнение процесса обновления плана, а также за его итоговое качество и актуальность.

Члены команды проекта и Ключевые пользователи обязаны своевременно предоставлять обратную связь и предложения по улучшению коммуникационных процессов.

Управляющий комитет осуществляет контроль за своевременностью и обоснованностью обновлений, особенно в части, касающейся стратегических коммуникаций и использования ресурсов.

9 Глоссарий терминов

Заинтересованная сторона (Стейкхолдер): Физическое или юридическое лицо, группа или организация, которые активно участвуют в проекте, либо чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения или по завершении проекта.

Эскалация: Формальная процедура передачи вопроса, проблемы или риска на более высокий уровень управления для своевременного принятия решения.

Статус-отчет (Status Report): Регулярный документ, информирующий заинтересованных сторон о текущем состоянии проекта, включая прогресс, ключевые проблемы, риски и планы.

Ключевые пользователи (Key Users): Сотрудники заказчика, представляющие бизнес-пользователей будущей системы, участвующие в сборе требований, тестировании и приемке.

Управляющий комитет (Steering Committee): Высший коллегиальный орган управления проектом, состоящий из ключевых руководителей, осуществляющий стратегическое руководство и контроль.

Спонсор проекта (Project Sponsor): Ключевая фигура, представляющая интересы бизнеса, наделяющая проект полномочиями и ресурсами, несущая ultimate ответственность за его успех.

Тройственное ограничение (Triple Constraint): Фундаментальная концепция управления проектами, описывающая баланс между содержанием, сроками и бюджетом.

Базовый план (Baseline): Утвержденная версия расписания, бюджета или содержания проекта, используемая в качестве эталона для сравнения с фактическими показателями.

1С: Предприятие 8.3: Платформа для автоматизации бизнес-процессов, на которой разворачивается прикладное решение.

Конфигурация: Прикладное решение, созданное на платформе "1С: Предприятие" для автоматизации конкретных видов учета (например, "Торговля и склад").

Типовая конфигурация: Конфигурация, разработанная фирмой "1С" и распространяемая как тиражное решение.

Доработка (Кастомизация): Изменение типовой конфигурации или разработка новых функциональных модулей для удовлетворения специфических требований заказчика.

Промышленная эксплуатация (Production): Стадия жизненного цикла системы, на которой она используется для выполнения реальных бизнес-процессов после успешного завершения внедрения и опытной эксплуатации.

Канал коммуникации (Communication Channel): Средство или путь, используемый для передачи информации от отправителя к получателю (например, email, совещание, мессенджер).

Синхронная коммуникация (Synchronous Communication): Обмен информацией в реальном времени, когда участники взаимодействуют одновременно (например, видеозвонок, личная встреча).

Асинхронная коммуникация (Asynchronous Communication): Обмен информацией, при котором между отправкой сообщения и получением ответа проходит время, и участникам не требуется присутствовать одновременно (например, email, сообщения в чате).

Дашборд (Dashboard): Визуальная панель, отображающая ключевые метрики и показатели проекта в режиме, близком к реальному времени.

Репозиторий (Repository): Централизованное хранилище для данных, документов и другой информации проекта (например, Confluence).

NDA (Non-Disclosure Agreement): Соглашение о конфиденциальности, юридически обязывающее стороны не разглашать определенную информацию.

Бизнес-процесс (Business Process): Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя.

Техническое задание (ТЗ) (Technical Specification): Документ, содержащий технические и функциональные требования к системе, являющийся основой для проектирования, разработки и тестирования.

Критерий приемки (Acceptance Criteria): Набор условий, которые должны быть выполнены, чтобы результат работы или проекта считался принятым заказчиком.

Миграция данных (Data Migration): Процесс переноса исторических данных из старых систем учета во внедряемую систему 1С.

Опытная эксплуатация (Pilot Operation): Пробная эксплуатация системы ограниченным кругом пользователей в реальных бизнес-условиях перед полным развертыванием.

KPI (Key Performance Indicator): Ключевой показатель эффективности, количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.

Веха (Milestone): Значительное событие в проекте, отмечающее завершение ключевого этапа работ, не имеющее продолжительности во времени.

Риск (Risk): Неопределенное событие или условие, которое в случае наступления оказывает положительное или отрицательное воздействие на цели проекта.

Реестр рисков (Risk Register): Документ, содержащий результаты идентификации рисков, результаты качественного и количественного анализа рисков, а также план реагирования на риски.

Запрос на изменение (Change Request): Формальное предложение по модификации любого документа, deliverables, или базового плана проекта.

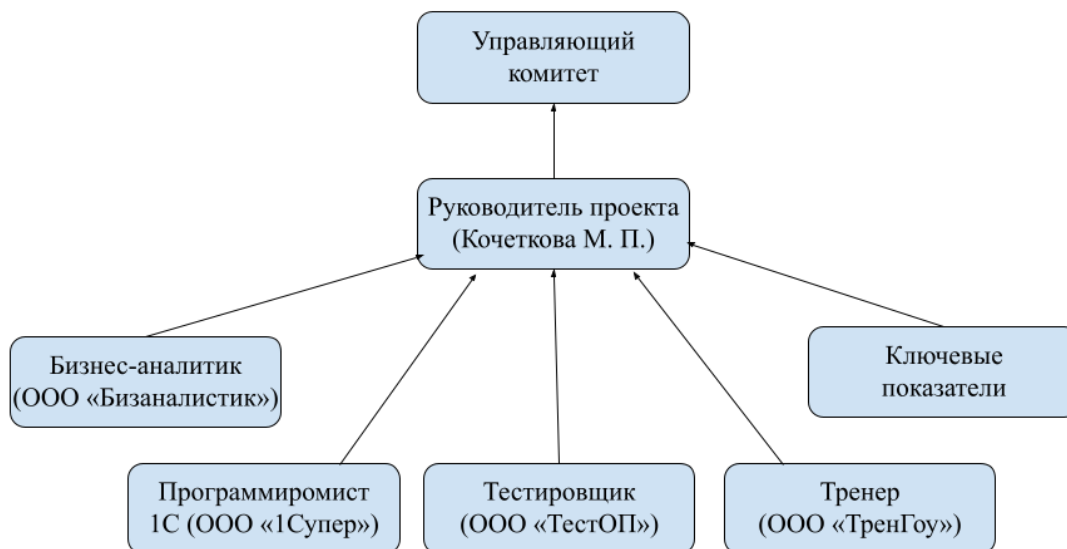


Рисунок 1. Общая схема коммуникаций

11 Ограничения коммуникаций

Защита персональных данных

- Основание: Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Ограничение: Запрещена передача персональных данных сотрудников (ФИО, должности, контактные данные) через незашифрованные или публичные каналы связи, такие как открытые email-рассылки, общедоступные мессенджеры или файлообменники. Любая коммуникация, содержащая персональные данные, должна осуществляться через корпоративные системы, обеспечивающие шифрование трафика (например, защищенные каналы в Microsoft Teams, корпоративная почта).
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Соблюдение коммерческой тайны

- Основание: Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», внутренние положения компании.
- Ограничение: Запрещено разглашение информации, составляющей коммерческую тайну ООО «Букка» (бизнес-процессы, финансовые показатели, клиентские базы, условия договоров с контрагентами), за пределы проекта и круга лиц, прямо уполномоченных на ее

получение. Внешние исполнители обязаны подписать NDA (Соглашение о конфиденциальности).

- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Лицензионные соглашения

- Основание: Лицензионные соглашения на используемое программное обеспечение (Microsoft 365, Jira, Confluence).
- Ограничение: Запрещено использование личных аккаунтов и нелицензионного ПО для проектной работы. Обмен файлами и совместная работа должны осуществляться только через санкционированные корпоративные инструменты.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Корпоративные политики информационной безопасности

- Основание: Внутренние регламенты ООО «Букка».
- Ограничение:
- Запрещено использование незарегистрированных внешних USB-носителей для передачи проектных данных.
- Запрещена установка неавторизованного ПО для коммуникаций (например, сторонних мессенджеров).
- Доступ к корпоративным коммуникационным системам извне сети компании разрешен только через установленный VPN-клиент.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

График работы и доступность

- Основание: Правила внутреннего трудового распорядка, трудовые договоры.
- Ограничение: Не допускается запланированное проведение совещаний и рассылка обязательных к прочтению сообщений outside рабочих часов (после 18:00 и до 9:00, в выходные и праздничные дни) для штатных сотрудников. Для внешних исполнителей действуют графики, установленные договорами.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Иерархия коммуникаций

- Основание: Организационная структура проекта.

- Ограничение: Ключевые решения и официальная позиция по проекту доводятся до заинтересованных сторон только через Руководителя проекта. Прямые коммуникации членов команды с Управляющим комитетом по проектным вопросам, минуя руководителя, не приветствуются, за исключением случаев эскалации этических нарушений.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Пропускная способность каналов связи

- Основание: Технические возможности ИТ-инфраструктуры компании.
- Ограничение: Размер вложений в электронные письма не должен превышать 25 МБ для предотвращения перегрузки почтовых серверов. Для передачи больших файлов необходимо использовать ссылки на корпоративный SharePoint или OneDrive.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Совместимость форматов

- Основание: Стандарты компании, необходимость обеспечения долгосрочной доступности документов.
- Ограничение: Для официальной документации (отчеты, ТЗ, протоколы) должны использоваться открытые или широко распространенные форматы (PDF, DOCX, XLSX). Запрещено использование узкоспециализированных или проприетарных форматов, требующих специфического ПО для просмотра.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта

Доступность систем

- Основание: Графики технического обслуживания ИТ-систем.
- Ограничение: Еженедельное техническое обслуживание корпоративных систем может проводиться в воскресенье с 02:00 до 06:00, в течение которого возможна недоступность некоторых коммуникационных инструментов. Критические коммуникации на это время не планируются.
- Действие: Учитывается при планировании совещаний и сроков.

Язык коммуникаций

- Основание: Внутренний регламент компании.
- Ограничение: Официальным языком проекта является русский язык. Вся официальная переписка, документация и совещания проводятся на русском языке. Использование английской или иной терминологии допускается только в технических спецификациях, где это необходимо для однозначности, с обязательным пояснением или приложением глоссария.
- Действие: Обязательно для всех участников проекта.

Деловой этикет

- Основание: Корпоративная культура ООО «Букка».
- Ограничение: В официальной переписке и на совещаниях принято обращаться к участникам на «Вы» по имени и отчеству, если иное не оговорено заранее. Недопустимо использование неформального или фамильярного стиля в коммуникациях с руководством и между участниками, не состоящими в дружеских отношениях.
- Действие: Рекомендовано к соблюдению всеми участниками проекта.

12 Заключение

Настоящий План управления коммуникациями проекта «Внедрение системы "Книжный магазин" на платформе 1С: Предприятие 8.3» представляет собой комплексную систему процессов, процедур и регламентов, направленных на обеспечение эффективного, своевременного и целенаправленного обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами.

Реализация положений настоящего плана позволит создать прозрачную и предсказуемую коммуникационную среду, минимизировать риски, связанные с недостоверностью, несвоевременностью или недостаточностью информации, а также способствовать формированию общего понимания целей и статуса проекта среди всех участников.

План управления коммуникациями является динамичным инструментом и будет регулярно пересматриваться и актуализироваться по мере развития проекта, изменения состава стейкхолдеров и накопления опыта. Соблюдение установленных в плане процедур и регламентов является обязательным для всех участников проекта и служит важным условием для достижения проектных целей в установленные сроки и в рамках утвержденного бюджета.
